# Kraken Migration PJ - Phase1
# 定期ステコミ　25年度 第1Q

2025年7月7日

東京ガスカスタマーサポート

東京ガスiネット

東京ガス　DX推進部

東京ガス　エネルギー事業革新部

TOKYO GAS

TOKYO GAS Co., Ltd. 2023 無断複製および引用・配布等をお断りします

# 本日の定期ステコミの主旨

＜要旨＞

- 前回ステコミでは、2025年8月のCC&B脱却を最優先とする開発方針とし、要件定義を急ぎ開発に着手する方向性を提示した。その後、詳細な要件定義によりタスクが明確になるにつれ、**8月のCC&B脱却が難しいことが判明**。
- また、4月に発生した誤請求に伴って**引き続き安定したデータ移行**が求められていることに加え、**オペレーション（TGCS）の負荷が高まっていることの対策も必要**である。
- これらを踏まえて、**現実的かつ実効性のあるデータ移行のプランを再度作成しましたので、必要予算とあわせて議論**いただきたい。

**（報告事項）**

1．マイグレーションの進捗状況

2．4月に発生した誤請求の対応について

3．オペレーション改革の状況

4．新規受付機能の効果

**（承認事項）**

1．CC&B脱却までの計画と主な課題

2．2025年度のPJ予算額（今回追加申請分）


Copyright© TOKYO GAS Co., Ltd. All Rights Reserved.

# （報告事項） 1．マイグレーションの進捗状況

- 3月のトップメッセージ発出後、関係部門を交えた要件定義を加速。4月以降に詳細要件が整ったものから順次開発に入った。
- その後、**5月末に以下の理由から、8月電力CIS脱却が難しいことが判明**した。
  ① 通常は3～4コフォートにフォーカスして開発するところ、今回は18コフォートを一度に要件定義。**要件を積み上げた結果、8月末脱却が困難**なことが判明。
  ② 加えて、4月に約6,500件の**誤請求が発生しており、今後も安定した移行が必要**であり、マイグレーションを加速させることが困難であること。
  ③ また、**電力CIS脱却の手続きに1か月を要**する事も判明した(実質期限が7月末となる)
- 以上を踏まえ、6月中旬にプロジェクトメンバーに対して8月断念のメッセージを出し、新たに4半期毎の目標を明確にすることとした。

## ■電力CIS脱却の必須要件とその進捗

6月末現在で約173万件のデータ移行が完了。電力CISの約361万件（残188万件）の移行には、以下の機能の開発が必要。

| CC&B廃止に必要な機能 | | | 要件定義実施 | 残数 |
|---|---|---|---|---|
| 機能開発 | ① | 新規受付（電気使用開始） | 7月開発完了予定 | － |
| | ② | 電気ガス合算の残機能<br>（督促関連、延滞利息） | 7～8月開発完了予定 | 57万件 |
| | ③ | 電気Kraken＋ガスCiriusの切り分け機能（※新規受付開始の前に対応要） | 7月開発完了予定 | 100万件 |
| | ④ | 電気単独の残機能<br>（電気単独督促、域外ガス合算、一括請求、法人特別割引、公印、バーチャル口座、免税） | △<br>一部詳細化が必要 | 30万件 |
| | ⑤ | 今後要件定義が必要な特殊な取り扱いとなる移行<br>例）税金がかからない大使館等 | ×<br>未着手(新規) | 1万件 |

## ■8月脱却を前提としたリスクへの対応について

### （1）電力CIS（オラクルCC&B）の脱却

- INETが詳細調査した結果、電力CIS（オラクルCC&B)から脱却しなくとも、1サーバーの撤去にて対応可能なことが判明。
- （対策）現在、8月中の撤去に向けてINETが作業を実施中。

### （2）電力CISの契約延長に伴う追加コスト

**①維持管理費（INETへ支払い）**

- 電力CIS稼働中はシステム維持管理体制は必要(現状：約4000万円/月)。
- （対策）8月以降は体制縮小により追加コストを抑制する。（主に電単30万件残の想定で、約2300万円/月と想定）

**②保守費（Oracleへ支払い）**

- 年間に6回の保守満了月があり、都度打ち切りが可能。次回は7月末 9千万円、次々回は11月末 9.8千万円。
- （対策） (１)のサーバー撤去を完了後、早期に打ち切る方針。

**③TGCSの追加コスト**

- 新規受付・切り分け機能の開始が予定の6月より遅延しているため、TGCSで廃止を予定していた電力事務の外部委託の継続が必要。（約1億円）


Copyright© TOKYO GAS Co., Ltd. All Rights Reserved.

# （報告事項）２．4月に発生した誤請求の対応について

- 4月に、電気・ガス合算のお客さま**約6,500件に対して過大請求（総額約120万円、平均180円/件）が発生。3月の電気料金値上げの際、一部のお客さまに対し2月以前の請求について新単価で請求**を行ったことが原因。システムの改修は不具合を覚知後、即時対応済み。
- 契約継続中のお客さまには翌月相殺の形で返金し、解約済のお客さまには原則クオカード送付により個別対応済。クレームは発生していない。
- HPでの公表も実施したため、総務部文書GよりMETIに報告。**METIからは「課長補佐からの口頭指導」**という処分を受けた。

## ■トラブルの原因及び恒久対応

- 対象範囲：Krakenにおける5つの料金計算ルートのうち、「電気・ガス合算契約のガス閉栓時の電気・ガス料金計算」において発生。
- 原因：「複数の電気料金をまとめて計算する」という処理をする際に、請求最終月の料金単価のみを参照する不備があった。
- 恒久対応：**単月ごとの料金単価を用いて計算する仕様に改修済。**

改修前の仕様

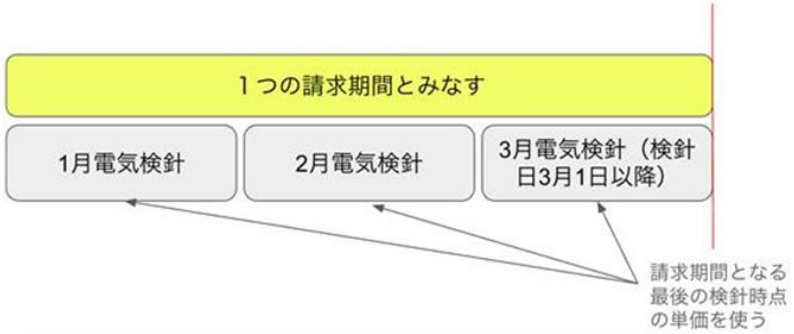


改修後の仕様




## ■お客さま対応および再発防止策

| | 件数 | 金額 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 過小請求 | 2件 | 7円 | 追加請求しない |
| 過大請求・契約中 | 275件 | 1～2,196円（平均200円） | 翌月相殺で返金 |
| 過大請求・解約中 | 6,210件 | 1～6,598円（平均179円） | QUOカード送付※ |

※1,500円以上のお客さまには、架電の上口座返金かQUOカード送付どちらが良いか確認

- お客さまからの問い合わせは**67件（反響率1%）**。

「金額が高い（最終精算分のため複数月分）」「mTG表示内容の確認」「ちゃんと解約できているのか」といった問い合わせがほとんどで、クレームにはなっていない。

- 再発防止策として、**料金改定時には全ての料金計算ルート別にテストを実施するよう、業務フローの見直し・手順の明記**を実施済。

## ■METIからの処分

- 金額規模や、謝罪・返金および再発防止策という対応がとられている等の点に鑑みて、最も簡易な行政指導である課長補佐からの口頭指導という処分となった。

「誤請求の金額が大きくなれば、社会的影響も大きくなることから、今後は同様の事案を起こさぬよう、体制整備・社内での周知徹底に努めること」


Copyright© TOKYO GAS Co., Ltd. All Rights Reserved.

# （報告事項）３．オペレーション改革の状況

- **チーム制の進捗**：5月に実施したチーム毎の電話振り分け機能実装（Genesys）し、**チーム制運用を開始**した。チーム間で応答率が比較できるなどの効果があり、順調に推移。 現在、更なるお客さまへの最適な対応を目的とした顧客群別チーム制開始に向けて検討着手。
- **業務効率化の進捗**：Kraken導入により、**一部業務（アンペア変更等）についてはワンストップ化が図られ、業務効率化に大きく寄与**した。一方で、Krakenへの**機能未実装を主な要因として、オペレーション負荷が増加している業務もあり、今後必要な機能を整理していく予定**である。

## ■ワンストップ化が図られた業務

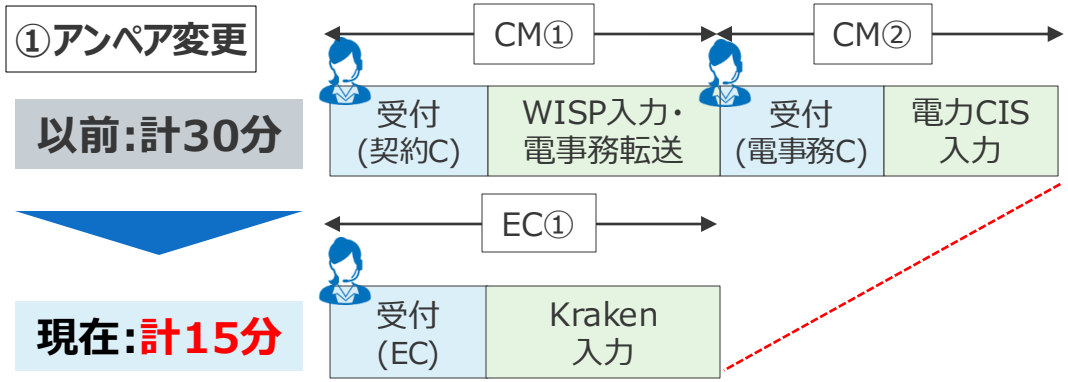


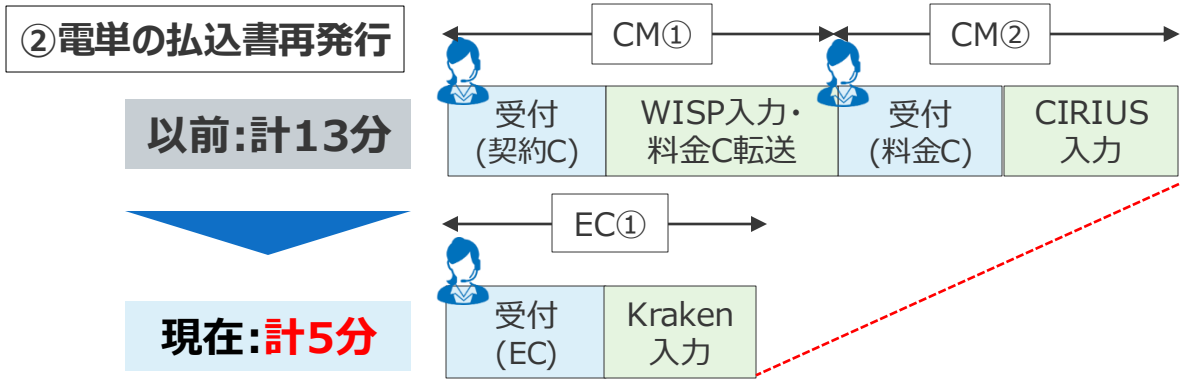


## ■オペレーション負荷増加の要因

オペレーション負荷の増加について、具体的には**①ベース機能の構築②従来システムで閲覧可能であった情報が見れないこと③自動処理機能の未実装④システム間連携機能の未実装**等が要因として挙げられる。

| 要因 | 発生事象 | 今後の対応策 |
|---|---|---|
| ①ベース機能の構築 | **・料金関連業務（訂正業務,返金処理等）のハンド作業**<br>**・検針票再発行業務のハンド作業** | ８月脱却を優先し、機能開発を先送りしていたため、今後は最優先で着手 |
| ②従来システムで閲覧可能な情報が見れない | ・詳細な支払い情報等が閲覧できないことによる**別システムでの確認**<br>・契約状況が分かりにくいことによる別箇所への確認・エスカレ発生 | Krakenのみの改修を中心に、スピード感をもって対応する（2Q） |
| ③自動処理機能未実装 | ・新規電単顧客受付時における**後続処理対応の発生**<br>・顧客契約変更時の**システム戻し作業**(例:ガス電気セット⇔電単　等) | 他システムを絡めて改修する必要があるため時間を要する（3,4Q） |
| ④システム間連携未実装 | ・受付や異動情報等のKrakenと他**システム(WISP、CIRIUS)への二重登録** | |


Copyright© TOKYO GAS Co., Ltd. All Rights Reserved.

# （報告事項）４．新規受付機能の効果

- Krakenによる**新規受付機能は、オペレーションの効率化に寄与することに加え、電力CIS脱却に必須な機能**である事から、６月中のリリースを目指して開発を進めていた。**現在7/17の新規受付開始に向けて開発**を進めている。

## ■「新規受付」機能とは？

これまでは、Krakenのお客さまはマイグレーション計画の基、既存顧客の移管にのみ留めていた。「新規受付」機能の実装に伴い、新たに東京ガスとご契約（再点・切替）されたお客さま情報もKrakenで管理することができる。

## ■「新規受付」機能実装に伴う業務フロー

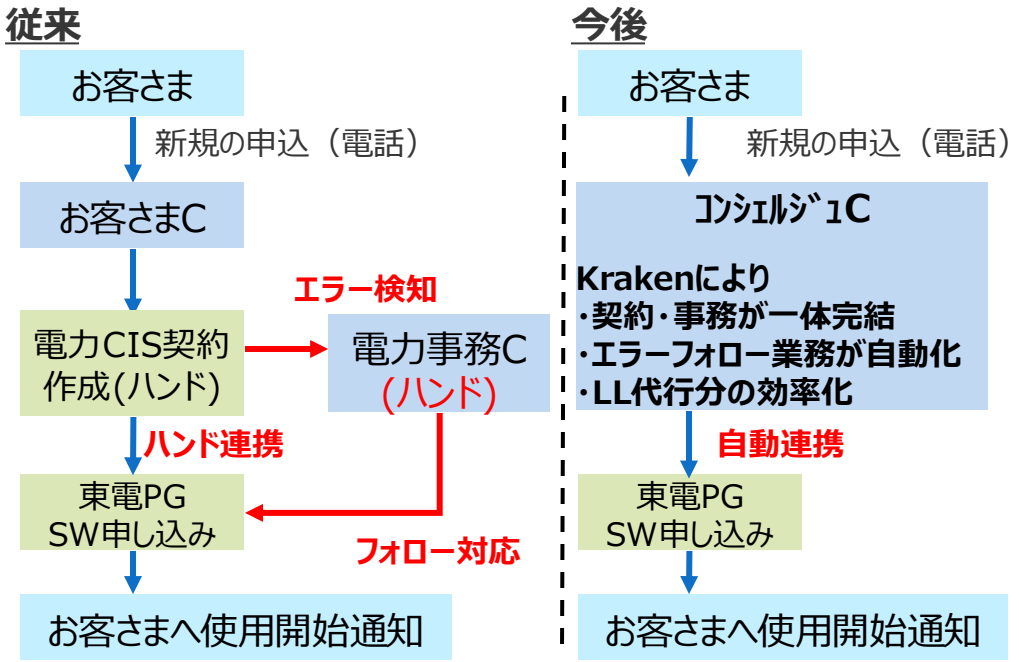


**効果：**エラー対応の業務効率化、ハンド対応削減に伴うミス減少　等

## ■業務効率化例（供給地点空欄フォローの機能）

- 新規受付の約4割を占めるLL代行件名では、供給地点番号を空欄で受付し、後から確認するケースが多く発生する。
- Krakenの契約作成処理開始時に供給地点番号が空欄の場合、自動化処理が出来ず、Krakenの機能が活かせない。
- そのため、供給地点空欄の場合は、WISPでエラーフォローした後にKraken連携するプロセスとなるようにTG-WISPを改修した。

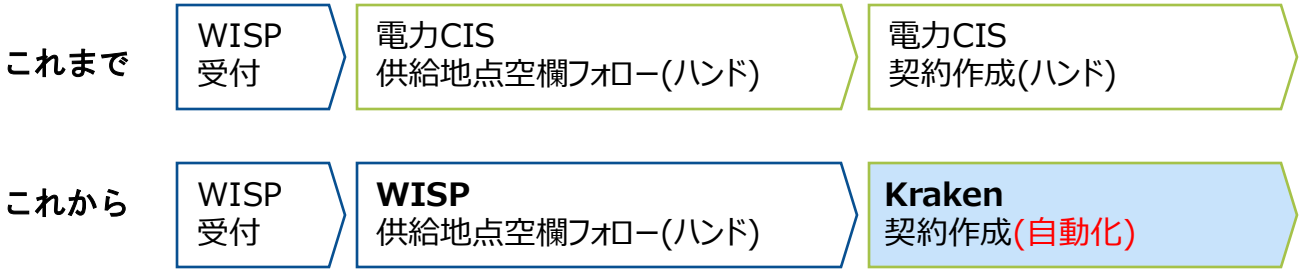



Copyright© TOKYO GAS Co., Ltd. All Rights Reserved.

# （承認事項） 1． 今後のスケジュール

- Kraken側からも次回スケジュールは確度の高いものを求められており、現実的・実効的なスケジュールとしたい。主な方針は以下の通り。
  ① 従来通り、並行するコフォートは3～4を越えない様に計画し、フォーカスする。
  ② 開発が中心となるBilling W/SやPayments W/Sに定期的なフィードバックサイクル(改善サイクル)を導入する　※ターム毎に振り返りを行う
  ③ 顧客影響が発生する場合を除き、既に着手済みの機能開発は、原則として中断しない。
- **2Q末は、電気ガス・電気単独合わせて約300万件の移管を目指すと供に、①政策対応としての新料金、②返金や料金訂正といった顧客対応の基本機能開発など、オペレーション改善を優先**して進める。**3Q末には、電気・ガス合算は概ね移管を完了**させる。

| 四半期 | 機能開発 | オペレーション改善 | 移管予定件数 |
|---|---|---|---|
| 2Q | ① 政策対応として必須の機能 (**BTM料金、ポイント料金**)<br>② **顧客対応の基本機能・ 電気ガス合算の残機能**<br>(延滞利息、公印対応、少額請求等) | **・新規受付**<br>電気(主に再点)が効率化<br>**・基本機能**<br>返金や料金訂正がKraken上からオペレーション可能となる | 電気ガス 275万件(＋120万件)<br>電気単独 28万件(＋10万件) |
| 3Q | ① **電単の残機能** (一括請求、B2B、バーチャル口座、免税等)<br>② 電力・ガスを切り分けを正しい姿に戻し効率化<br>(暮らしES、警報器リース、TESメンテ) | ・名義変更時の2重入力<br>（Kraken/CIRIUS）を解消する | 電気ガス 312万件(＋37万件)<br>電気単独 33万件(＋5万件) |
| 4Q | ① 電気単独で**取り扱いが難しいロングテールへの対応(大使館等)**<br>② 東電エリア以外への全国対応<br>③ **小規模CISの統合** (TG-Link等)<br>④ **ガス料金改定** | ・新規受付において、電気のみならず、ガスも効率化<br>・電力系CISが1つに統合され、システム使い分けが不要となる。受付も統合。 | 電気ガス 312万件<br>電気単独 49万件(＋16万件) |
| 次年度 | ① ガス督促・解約<br>② 電力・ガスを切り分けた状態を正しい姿に戻す（ガス大口・業務用） | ・ガス情報がKrakenのみで確認できる | — |


Copyright© TOKYO GAS Co., Ltd. All Rights Reserved.

# （承認事項） 2．2025年度のPJ予算額（今回追加申請分）

- 体制費については、第1Qの8月の電力CIS脱却を最優先とし、設備の体制費についてはINETの開発体制増員、諸経費の体制費については、トラブル時のエラーフォロー等のINETの保守体制やプロジェクトマネジメント体制を増員した。8月以降も大規模移行に備えて体制維持をする必要性があり、8-10月の体制費に計上する。
- 年間設備予算については、Ph1（電力単独＋電力ガスセット）の移行を終えるのにQ4まで掛かる見込みのため、Ph1分の**年間見通しでは設備予算（約6.4億円）が超過となる見込み**である。なお、Ph2（ガス単独）分として、25年度に設備「約7億円」は申請している。
【参考】政策対応(BTM料金・ポイント料金、設備9.5億円、諸経費2.1億円)については本PJで統合して予算申請し、設備・諸経費を削減済み
- 年間諸経費予算については、ライセンスフィーの支払いも後倒しになるため、予算内に収まる見通し。
- **11月以降に向けては、①強化したPM体制の縮小 ②開発・保守体制費の適正化 等の支出抑制策を具体化し、次回10月のステコミにて報告**させて頂きたい。

■IT予算（千円）

＜今回ステコミで承認後、予算措置＞

| | | 4月～7月予算 | 4～7月実績 | （差異） | 年間予算（Ph1） | 年間見通し（Ph1） | （差異） | 今回追加申請分 8～10月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備 | 体制費 | 594,485 | 559,890 | ▲34,595 | 827,502 | 1,470,264 | 642,762 | 233,017 | 現行体制維持 |
| 諸経費 | 体制費等 | 381,978 | 632,998 | 251,020 | 800,575 | 1,543,885 | 743,310 | 556,817 | 現行体制維持 |
| | Kraken社支払分(ライセンスフィー) | 1,919,364 | 788,064 | ▲1,131,300 | 6,520,286 | 5,666,276 | ▲854,010 | 1,203,221 | |
| | 小計 | 2,301,342 | 1,421,062 | ▲880,280 | 7,320,861 | 7,210,161 | ▲110,700 | 1,760,038 | |

※Ph1＝電気単独・電気ガスセットの移管

■IT予算：設備（千円）

| 項目 | | 設備 |
|---|---|---|
| 承認済み予算（23・24・25年度申請分） | ① | 1,954,916 |
| うち執行済予算 | ② | 1,920,323 |
| 差異（→8～10月へ繰越） | ③＝①－② | 34,593 |
| **今回追加申請（25年度8～10月）** | ④ | **233,017** |
| **予算合計（23・24・25年度合計）** | **⑤＝①＋④** | **2,187,933** |

■IT予算：諸経費（千円）

| 項目 | | 諸経費 |
|---|---|---|
| 執行済み予算（23・24年度申請分） | ① | 2,923,396 |
| 承認済み予算（25年度申請分） | ② | 2,301,342 |
| **今回追加申請（25年度8～10月分）** | ③ | **1,760,038** |
| **予算合計（23・24・25年度合計）** | **④＝①＋②＋③** | **6,984,776** |


Copyright© TOKYO GAS Co., Ltd. All Rights Reserved.

# （参考） 1．PJ予算額（IT予算年度展開）

■IT予算：Phase1総額見通し（千円）

| 大項目 | 項目 | 2023年度 | | 2024年度 | | 2025年度 | | | | | | Phase1合計見通し | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 4月～7月 | | 8～10月 | | 11～3月：見通し | | | |
| | | 設備 | 諸経費 | 設備 | 諸経費 | 設備 | 諸経費 | 設備 | 諸経費 | 設備 | 諸経費 | 設備 | 諸経費 |
| TGシステム（開発・保守） | PJ体制費： PJメンバー体制費、HUB・ツール含む | 177,172 | 124,844 | 410,096 | 452,946 | 258,453 | 246,666 | 152,405 | 404,401 | 478,403 | 534,624 | 1,476,529 | 1,763,482 |
| | 関連システム：関連システム改修費用 | 106,177 | 4,517 | 666,987 | 318,106 | 336,032 | 69,952 | 80,612 | 28,623 | 164,359 | 47,706 | 1,354,166 | 468,904 |
| | DataBricks利用料 | - | | - | 111,515 | - | 65,360 | - | 123,793 | - | 22,759 | - | 323,427 |
| Krakenシステム | 利用料：ライセンス費（クラーケン） | | 38,828 | - | 1,207,829 | - | 1,167,468 | - | 829,175 | - | 1,904,719 | - | 5,148,017 |
| | 利用料：ThirdParty費用等（Twillio等） | | 37,617 | - | 121,574 | - | 651,896 | - | 254,369 | - | 399,619 | - | 1,465,074 |
| | 人件費：Migration体制費 | - | 162,875 | - | 342,745 | - | 100,000 | - | 119,677 | - | 239,354 | - | 964,651 |
| | **IT予算合計→** | **283,349** | **368,681** | **1,077,083** | **2,554,715** | **594,485** | **2,301,342** | **233,017** | **1,760,038** | **642,762** | **3,148,781** | **2,830,695** | **10,133,557** |

現行体制維持

①PM体制縮小
②開発・保守体制の適正化
等の支出抑制策を今後実施

（参考）予算申請時の25年度予算（Phase1+Phase2）（千円）

| 大項目 | 項目 | 2025年度 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Phase1 | | Phase2 | | Phase1+Phase2 | |
| | | 設備 | 諸経費 | 設備 | 諸経費 | 設備 | 諸経費 |
| TGシステム（開発・保守） | PJ体制費： PJメンバー体制費、HUB・ツール含む | 323,454 | 460,000 | 195,005 | -（Ph1に含む）- | 518,458 | 460,000 |
| | 関連システム：関連システム改修費用 | 504,049 | 209,855 | 504,050 | -（Ph1に含む）- | 1,008,098 | 209,855 |
| | DataBricks利用料 | - | 130,720 | - | -（Ph1に含む）- | - | 130,720 |
| Krakenシステム | 利用料：ライセンス費（クラーケン） | - | 4,230,000 | - | 530,000 | - | 4,760,000 |
| | 利用料：ThirdParty費用等（Twillio等） | - | 1,990,286 | - | 154,848 | - | 2,145,134 |
| | 人件費：Migration体制費 | - | 300,000 | - | -（Ph1に含む）- | - | 300,000 |
| | **IT予算合計→** | **827,502** | **7,320,861** | **699,055** | **684,848** | **1,526,557** | **8,005,709** |


Copyright© TOKYO GAS Co., Ltd. All Rights Reserved.
