Kraken Migration PJ - Phase1
定期ステコミ　25年度 第4Q

2026年3月12日

東京ガスカスタマーサポート

東京ガスiネット

東京ガス　DX推進部

東京ガス　エネルギー事業革新部

TOKYO GAS

Copyright© TOKYO GAS Co., Ltd. All Rights Reserved.

本日の定期ステコミの主旨

本日の主な論点は以下の通り。

1）**新年度を迎えるにあたってPJを概観し、26年度のアクション**を提示する。

2）前回ステコミで指摘の**オペレーションの改善予定について報告**を行う。

3）機能開発の今後の進め方
・前回のステコミでは、26年度以降に着手するコホートは**複雑なロングテールであり、開発期間が超長期化する可能性を確認。**
・本日は、長期化を回避するために**「複雑機能の開発における業務のシンプル化（場合により約款変更も含む）」の方向性について議論する。**

なお、４Qにフォーカスした新規受付は、１２月に一般受付開始、１月上旬にLL代行分を開始（LL代行会社別に段階的に受付開始中※）、2/26にライフバル受付を開始しており、計画通りに進行。４月にはWEB受付を開始予定。
※一部の業務（日時変更等）で、営業部（TG－COM）の負荷への懸念があり、ピーク期はLL代行の範囲拡大を止めている。

（報告事項）

1．KrakenPJの概観と26年度のアクション

2．オペレーション改革
（1）ピーク期前の取組について
（2）目指す姿へ戻るステップ

（承認事項）

3．複雑な機能開発における「業務シンプル化」について

4．2026年度のPJ予算額（今回追加申請分）

Copyright© TOKYO GAS Co., Ltd. All Rights Reserved.

事前説明でいただいた主なご意見

1．KrakenPJの概観と26年度のアクション

発言者	頂いたご意見/ご質問	（質問の場合）回答
中村社長	・mTGとの直連携がボトルネックとなり、新料金のリリースが2027年度まで長引いてしまうのは遅いのではないか？	・mTGとの直連携に関しては、**26年度から27年度にかけて3段階でリリースを予定**している。事業法の必要な機能を実装して**新料金リリースに適応するのは26年度中盤、現在のｍＴＧ同等の機能・ID連携まで盛り込むと27年度**を予定。(資料修正済み)
遠藤社長	・テスト環境についての言及があったが、Krakenのどの部分において、想定以上に質が低く、今回の打ち手に繋がっているのか構造化して欲しい。	・本番環境でリリース⇒エラー覚知⇒リカバリーという手順を踏む中で、**KT社の日本エンジニアで、開発～リカバリまで一貫して対応しているため、そのキャパシティでは対応しきれていない**点が問題。そのため、①本番リリースでのエラーを減少させるため、テストデータの充実。②加えて、グローバル機能の活用を依頼している。
沢田常務	・iNET要員について、従来は問題発生の都度、要員補充するリアクティブな対応であった。今後は、**PJに必要なスキル/要員数を見据えたプロアクティブな要員計画を実施したい。**	ー

2．オペレーションの改善予定

TGCSさんより最新状況の共有をお願いいたします。

3．複雑な機能開発を避ける為の業務シンプル化

発言者	頂いたご意見/ご質問	（質問の場合）回答
中村社長	・**「総合契約」は東京ガス固有ではなく、日本のガス業界で共通の業務要件**であるため、Kraken側で機能を開発すべきでないか？	・総合契約を廃止する以外に、「２メーターの取りまとめ機能を簡略化する」対応で代替ができないか等の選択肢も含め検討している。4月以降に詳細を詰めていく。
大橋部長 岸澤部長	・「業務シンプル化」ついて、**ステコミでは収支影響や対応等大枠の方向性を提示し、今後は事業側で最終的な判断を進める**認識でよいか？	・今回ステコミでいただいたご意見を踏まえたうえで、**最終的な判断は事業側で対応する**という認識である。 ただし、検討中の項目は、収支/当社影響や大枠の対応方針を明示できていないため、今後ステコミの場で挙げていきたいと思う。

（報告事項） 1．Krakenプロジェクト の概観と26年度に向けて　①全体

- KrakenPJは、「**進化する電力ビジネスへの対応**」「**オペレーション改革**」「**Krakenを契機としたシステムモダナイズの実現**」を目的に開始した。現状の問題に対して、26年度は下記の方針で進めて行く。

■目的達成に向けた今後のアクション

		当初想定	現状(データ移行期)	26年度のアクション
目的１：電力ビジネスへの対応	**料金戦略/将来性**	• 新料金メニューを迅速/安価に生成できる • ΔKWビジネス等将来のﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙへの高い柔軟性	■ 主要な機能が揃わないと、**新料金をリリースできない。** ■ 最終的に迅速な料金策定を実現するには、**周辺システムのモダナイズも必要**	• **主要な機能開発を26年度10月末**を目指す • **mTG(CIRIUSベース)とKrakenの直連携PJ**は26-27年度にかけて3段階リリース予定 • (注)ガス料金の場合、LIVALITのモダナイズも必要
目的２：オペレーション改革	**チーム制/ﾜﾝｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ**	• チーム制によるCX向上 • ワンオペレーションによるローコスト化	□ **マインドセットや自律性の向上** ■ **データ移行期は複数システムのハンド作業の負荷が増大。**	• **4月よりハンド作業軽減に向けた開発**を実施
	要員計画	• ECは全正社員で採用想定（自ら顧客のために動く）	■ **人員不足が今後のマイグレーションを止める可能性**	• **採用/教育計画の見直し** ⇒EC増員。夏までに体制を整える（後述）
目的３：モダナイズの実現	**大規模ｱｼﾞｬｲﾙ開発**	• 迅速な開発体制/コホート単位の移行	■ 業務シンプル化は行っているが、４半期単位では大規模なシンプル化が困難 ■ Krakenにテスト環境がなく、トラブルが発生。加えてリカバリーが遅い。３段階ﾘﾘｰｽでトラブル抑制しているが限界あり	• **ロングテールのシンプル化**(約款変更含む) • Krakenの**コア機能活用とテストデータ等の見直しをKraken側へ求めていく**
	アーキテクチャー	• Krakenﾜﾝﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ/モダンなシステム同士の疎結合	□ **CP全体のEAが加速**	• **今後、ホスト脱却に向けた検討**が必要

Copyright© TOKYO GAS Co., Ltd. All Rights Reserved.

（報告事項）１．Krakenプロジェクト の概観と26年度に向けて　②開発体制

アイネット・ＴＧＣＳ・ＴＧ（主にＰＭ）において、下記の問題があり、新年度に向けて体制を整備中。

■現在の開発体制

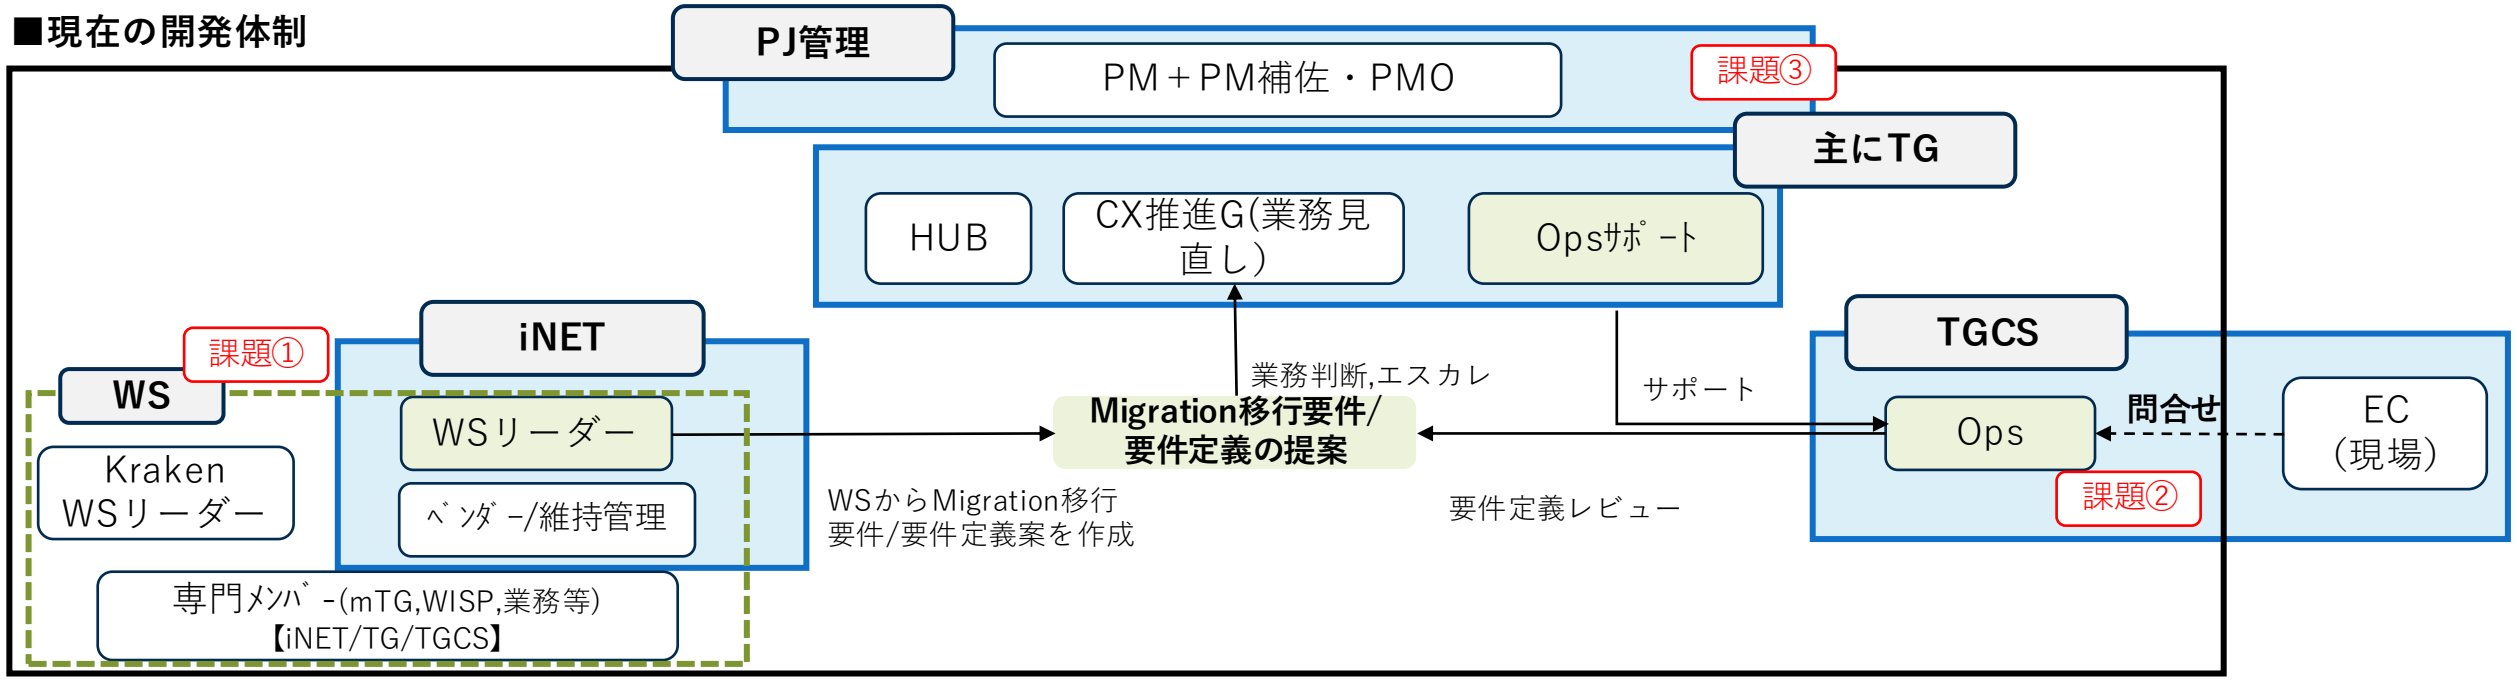

課題	26年度のアクション
①　＜アイネット＞ ・WSリーダーの専任化が出来ておらず、コスト面でも外部流出が発生。今後、開発負荷が大きい一部のWSがボトルネック化。	・**一部WSのリーダー/サブリーダー専任化**(対応継続中,残り2WS) ・**Industry・payment・Billingは複線化を予定** ・複線化に伴い専門メンバー(業務・運用・関連システム等)も適宜拡充
②　＜ＴＧＣＳ＞ ・要件定義／レビューを実施するOPSの人員不足／加えて、個々のECからの問合せも集中（本来はECリーダーの役割）	・**受付領域における要件定義/レビュー人員の増強（４月）**
③　＜ＴＧ＞ ・中期課題の検討が出来ていない ・ＰＭの外部リソースが増(コスト増だけでなく、ノウハウが内部に溜まっていない＝将来の外販等も難しい状態)	・残中期課題(ロングテール)の先回り検討チームをエネ事部に配置 ・社員のPM増（４月）と段階的に外部依存度を減少

＜参考＞３年間の推移

■開発スタイルの変遷

2023年10月 / 12月 / 2024年4月 / 10月 / 12月 / 3月 / 2025年4月 / 7月 / 10月 / 2026年4月

PJ開始

イベント

- ｱｰｷﾃｸﾁｬ決定（ガス含む）
- ガスセットの検討開始
- 100万件の大規模移行
- サービス合算の検討開始
- Oracleリスク発覚 → 8月電力CIS脱却目標設定 → 8月脱却断念
- 200万件達成
- 新規受付の段階リリース

対策

HUB活用
関連ｼｽﾃﾑ影響を抑制

CIRIUSﾚﾌﾟﾘｶ活用
ガスのﾚｶﾞｼｰｼｽﾃﾑへの影響を抑制

→ **EAの本格検討開始**

大量エラーや請求遅延発生

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ見直し
・主にTG のPM人員を増強(12月)
・エスカレルール策定(1月)
・3段階リリース導入によるエラー抑制(1月)

ｱｰｷﾃｸﾁｬの判断基準策定(10月)
・Krakenはｴﾈﾙｷﾞｰに強いSaasであり、その領域を優先。
・サービスは暮らしES基盤

複数ｺﾌｫｰﾄの同時検討・脱却必須で体制混乱
（数ｺﾌｫｰﾄでﾌｫｰｶｽして移管する良さが消滅）

→ **新規受付機能の遅延（要件定義不足）**

→ **EC体制不足に加え、機能不足による応答率低下**

開発体制の立て直し中
①OPS（TGCS)のレビュー・要件定義に幹部職をPMとして追加配置
②アイネットのWSリーダー・サブリーダーの専任化に着手

件数目標管理(開発順位が頻繁に変更)を見直し・機能単位の目標へ

Copyright© TOKYO GAS Co., Ltd. All Rights Reserved.

（報告事項）２．オペレーションの状況（短期：ピーク期対応）

- コンシェルジュC応答率は1月時点で50%を下回っており、前回ステコミでは「3月ピーク期前にシステム開発以外でも早急に対策を打つべし」とされた。応答率低下の大きな要因としては、**①要員不足、②Krakenの基本機能不足による事務業務増。**
- **LV戦略部やTGOEからの協力を得ながら、ピーク期に向けた打ち手**を実施。ただし、絶対的な要員不足により、厳しい状況が続く見込み。

■コンシェルジュCの応答率

	11月	12月	1月	2月	3月見通し
入電件数	91,930	97,147	85,331	81,643	138,699
応答件数	36,460	39,537	41,007	45,457	70,000
応答率	39.7%	40.7%	48.1%	56%	50%

	ピーク期の打ち手	ピーク期以降となった対策
受付要員の増加	・引越受付に特化した委託35名の採用 ・新規採用したEC41名を引越受付に特化して早期戦力化	・委託会社の増員を継続 ・現在、引越受付をしているEC41名の総合戦力化(7月)
受付業務への人員シフト（事務業務削減）	・LV戦略部BX推進Gが事務業務の分析を行い、13施策の効率化計画を策定。一部自動化ツールとナレッジbotを導入済 ・TGOEからの協力も踏まえ、供給地点特定番号ｴﾗｰﾌｫﾛｰの効率化を実施	・13施策を3～6月にかけて順次実装。最大8人工創出の見込み
電話呼量の削減	・AIオペレーター（ボイスポット）拡充（3月上旬開閉栓受付の改修、3月末供給再開受付リリース） ・WISPの開発(電単解約WEB受付、Kraken情報閲覧機能実装)	

Copyright© TOKYO GAS Co., Ltd. All Rights Reserved.

（報告事項）２．オペレーションの状況（中期：夏まで）

- 引越受付(委託)については、4月時点で応答率の安定を見込んでいる。一方で、総合受付(EC)については、新規採用した41名の育成期間を踏まえると、応答率が安定してくるのは7月頃となる見込み。このため、**夏頃までは大量移管は行わず、緩やかなカーブで移行件数を伸ばし、10月末に300万件を目指す。**
- 3月末360万件を見据え、**4月移行順次ECの追加採用を行っていく計画**である（約50名：4月10人、5月10人、7月20人、9月10人）。

■移行計画とEC要員計画の比較(2026年度)

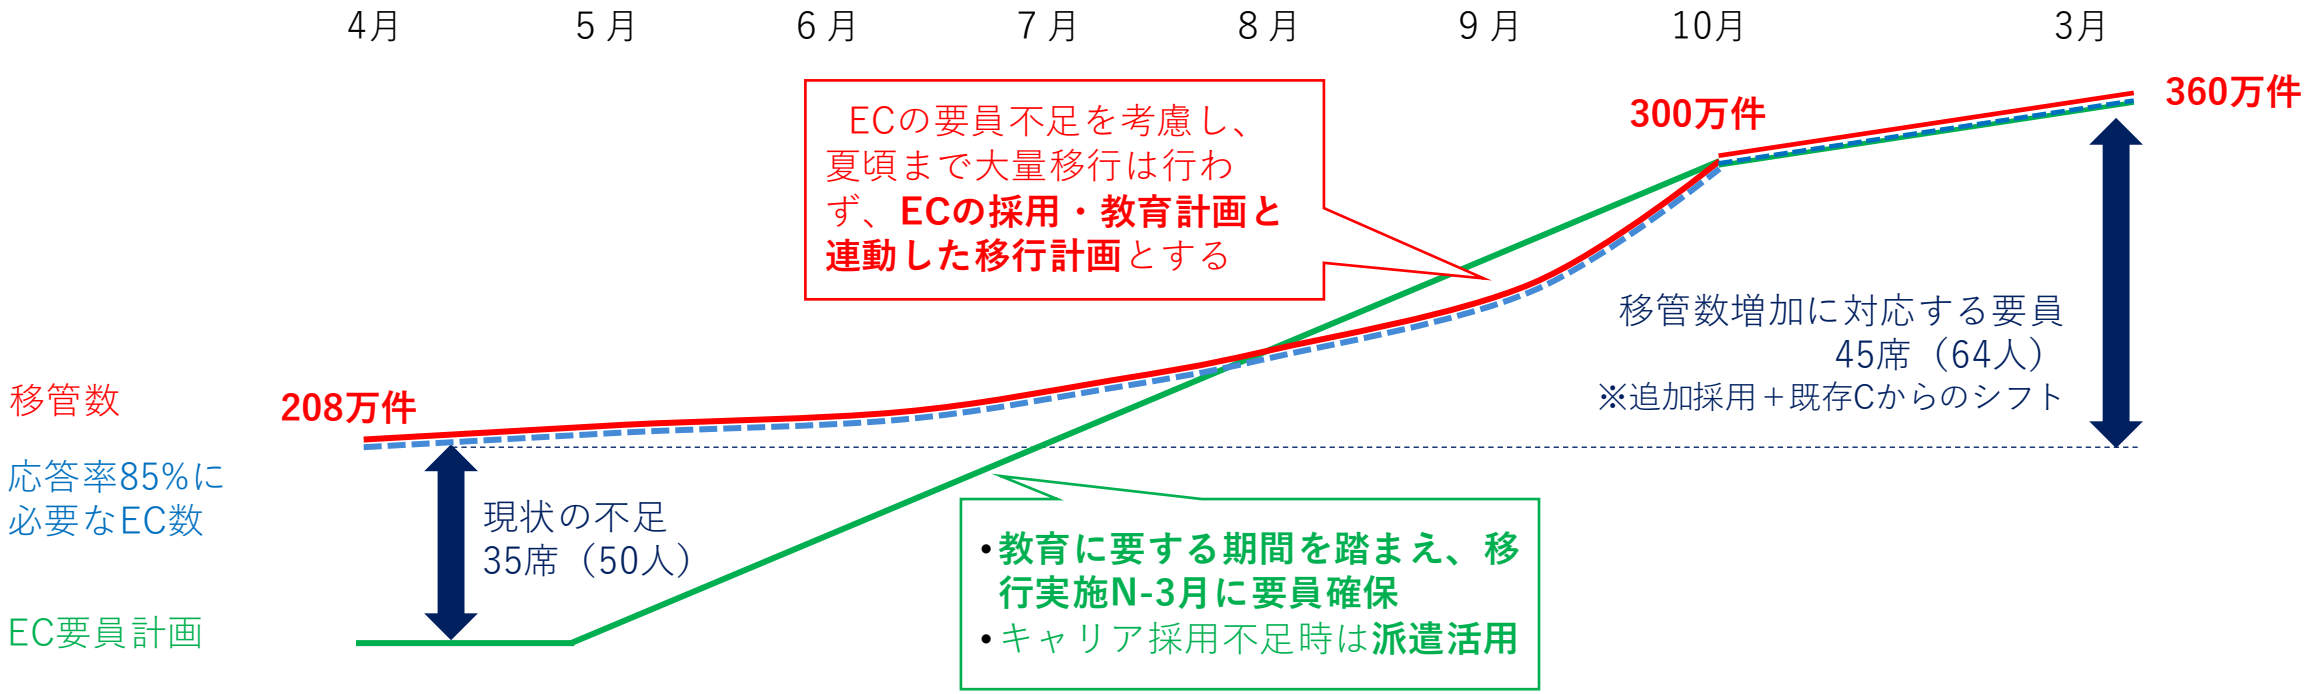

■2026年度の応答率想定

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
引越し(委託)	95.0%	95.0%	95.0%	94.1%	95.0%	84.0%	95.0%
総合受付(EC)	37.8%	44.8%	45.2%	68.6%	93.3%	87.0%	87.6%
ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ全体	66.7%	70.3%	68.3%	82.0%	93.8%	90.6%	91.1%

Copyright© TOKYO GAS Co., Ltd. All Rights Reserved.

（承認事項）３．複雑な開発件名における「業務シンプル化」の検討状況

- 前回ステコミにて、10月末までに300万件相当の機能開発を終了後、残る約50万件の移行には複雑な機能開発が必要な為、「業務そのもののシンプル化」をしなければ超長期化することを報告。
- シンプル化した場合の顧客影響・収支影響は以下の通りである。今後、詳細検討やBtoBとの調整も進めて行くが、**シンプル化の検討を深めて良いか、審議事項として確認をいただきたい。**なお、詳細の実施可否については、今後のステコミ等で明らかにしていく。

■ Krakenのベース機能に無く、TGカスタマイズが必要となる業務の対応方針

検討結果	内容	件数	シンプル化の方向性	顧客への影響	収支への影響
【審議対象】 シンプル化によりお客さまや収支に影響あり	① 総合契約 (1契約に複数メーター)	約4,800件 (BtoB 約12,000件)	総合契約を廃止し、メーター毎に契約を分割する/または、２メーターの取りまとめ機能を簡略化する/お客さまへの請求額は変わらないようにする。	請求合計金額は基本的に変わらないが、請求が複数に分割される。	託送料金のTG小売負担増 約2,000万円/年 ※TGｶｽﾀﾏｲｽﾞ の場合5億円超
	② 一括請求	約140,000件 (BtoB 約27,000件)	請求のまとめ方を1パターンに限定する。具体的には、一部のメーターを閉栓した際、そのメーターの最終請求を独立して請求していた「最終締」は廃止する。	閉栓したメーターの最終請求が他のメーターの請求と纏められ、判別が難しくなる。	なし
お客さまや収支に大きな影響なし	③ 床暖房賃貸など物件管理が必要な契約	約100,000件 (BtoB 約1,000件)	契約のみKrakenに移行し、物件情報はKrakenに移行しない。物件情報は現行システム等にて照会する。	なし	なし
	④ 旧TESメンテ契約	約243,000件 (BtoB 約1,600件)	旧TESメンテ契約の自然消滅までは、電気のみKrakenに移行する“移管B”を実施	なし	なし
検討中	⑤ 払込書で２枚目が来たら１枚目を払う顧客（移行時のみの問題）	電単 約25,000件 セット 確認中 (BtoB 確認中)	検討中 （1ヵ月分の未収債権のみ移管する方針。2ヵ月目の未収債権は、可能な限り最小化した上で欠損する。具体的な極小化策/セット影響等を引き続き検討。）	なし	未収債権 電単：最大２億円 セット：確認中 ※TGｶｽﾀﾏｲｽﾞ の場合3億円超
	⑥ バーチャル口座	約74,000件 (BtoB 約500件)	検討中		
	⑦ 口座払い翌月・翌々月指定サービス	約475,000件 (BtoB 約35,000件)			

（承認事項）４．2026年度のPJ予算額（今回追加申請分）

- 25年度見通し：設備/諸経費ともに年度予算内に収まる見通し。ただし、諸経費の「体制費:INET維持管理等」「体制費:TG発注(PMO)」が大幅に超過している点は課題。　（注）なお、体制費（HUB）は減少しているが、その分は関連システム費（ACCEPT等)がタスクをカバーしている
- 26年度予算は、25年度見通しと比較して、下記2点の費用抑制を目指す。
  ①「体制費:TG発注(PMO)」(青背景箇所)：**「外部(ACN)依存しているPMノウハウの巻き取り/内製化」による下期の費用抑制。**
  ②「体制費:INET開発」や「体制費:INET維持管理等」(黄色背景箇所)：WSの複線化によって**体制増強するため費用増加**見込み。一方で、**「維持管理の自動化による体制縮小」による費用抑制**を見込む。

■IT予算（千円）

＜今回ステコミで承認後、予算措置＞

		25年度予算	25年度見通し	年間見通し進捗率	26年度予算	今回追加申請分(26年度5-7月)	Ph1見通し
設備	体制費:INET開発	854,724	824,804	96.4%	820,964	235,241	-
	体制費:TG社員(HUB)等	571,389	222,449	38.9%	168,975	42,244	-
	関連システム改修費	100,444	392,122	390.3%	427,229	126,807	-
	小計	1,526,557	1,439,375	94.2%	1,417,167	**404,292**	4,216,973
諸経費	体制費:INET維持管理･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ等	278,316	1,319,473	474.0%	1,266,608	416,682	-
	体制費:TG発注(PMO等)	251,539	700,082	278.3%	645,096	161,274	-
	体制費:Kraken社	300,000	571,978	190.6%	551,099	137,775	-
	ライセンスフィー[移管件数]	4,370,000[約380万件]	2,829,565[約208万件]	64.7%	4,534,258[約360万件]	961,450	-
	その他:AWS費用等	2,121,006	404,149	19.0%	562,174	82,843	-
	小計	7,320,861	5,825,246	79.5%	7,559,235	**1,759,993**	16,307,876

※設備年間予算は、25年度のPh2分「699,055」を加えた金額にて記載

Copyright© TOKYO GAS CO.,LTD. All Rights Reserved.

Appendix. PJ予算額

■IT予算：設備（千円）

項目		設備
承認済み予算（23・24・25・26年度申請分）	①	2,955,178
うち執行済予算	②	2,955,178
差異（→5～7月へ繰越）	③＝①－②	0
今回追加申請（26年度5～7月）	④	**404,291**
予算合計（23・24・25・26年度合計）	⑤＝①＋④	**3,359,469**

■IT予算：諸経費（千円）

項目		諸経費
執行済み予算（23・24・25年度申請分）	①	8,748,641
承認済み予算（26年度申請分）	②	602,307
今回追加申請（26年度5～7月分	③	**1,759,984**
予算合計（23・24・25・26年度合計）	④＝①＋②＋③	**11,110,932**

■IT予算：Phase1総額見通し（千円）

大項目	項目	2023年度		2024年度		2025年度		2026年度						Phase1合計	
								4月：申請済		5～7月：申請		8～3月：見通し		見通し	
		設備	諸経費	設備	諸経費	設備	諸経費	設備	諸経費	設備	諸経費	設備	諸経費	設備	諸経費
TGシステム（開発・保守）	PJ体制費： PJメンバー体制費、HUB・ツール含む	177,172	124,844	410,096	452,946	1,131,950	1,942,596	94,498	151,245	313,495	543,723	725,987	1,119,963	2,863,121	4,335,317
	関連システム：関連システム改修費用	106,176	4,517	666,987	318,106	297,502	94,264	70,797	29,596	90,797	39,596	121,594	49,191	1,353,852	535,269
	DataBricks利用料	-	-	-	111,515	-	174,581	-	54,507	-	0	0	127,182	-	467,785
	GenesysCloud利用料	-	-	-	-	-	17,553	-	6,431	-	19,294	0	51,451	-	94,729
Kraken システム	利用料：ライセンス費（クラーケン）	-	38,827	-	1,207,829	-	2,829,565	-	296,908	-	961,450	0	3,275,900	-	8,610,479
	利用料：ThirdParty費用等（Twillio等）	-	37,616	-	121,574	-	194,712	-	17,695	-	58,147	0	205,858	-	635,601
	人件費：Migration体制費	-	162,875	-	342,745	-	571,978	-	45,925	-	137,775	0	367,400	-	1,628,696
	IT予算合計→	**283,348**	**368,679**	**1,077,083**	**2,554,715**	**1,429,452**	**5,825,246**	**165,295**	**602,307**	**404,291**	**1,759,984**	**847,580**	**5,196,944**	**4,216,973**	**16,307,876**

今回申請分

Copyright© TOKYO GAS Co., Ltd. All Rights Reserved.
